

（ 仮 称 ） 南 花 台 中 央 公 園 整 備 工 事 住 民 説 明 会 資 料

1. みなさまへのご報告として

令和 5 年度は基本設計、実施設計を完了し、工事業者選定入札に向けて準備を進めてまいりました。
令和 6 年 5 月の工事入札では工事業者の決定に至りませんでした。（入札不調）その後、設計の内容を一部見直し、再度 11 月に入札が行われ、村本建設株式会社が落札しました。

村本建設株式会社
本社 大阪市天王寺区上汐四丁目 5-26 代表取締役社長 久米 生泰
総合建設業及びこれに関連する業務を手広く展開

2. 今後の工事スケジュール ※状況により変更の可能性があります

1. 土砂搬出工事期間の変更
当初 令和 6 年 8 月～令和 7 年 1 月（ 6 カ月） ➡ 変更 令和 6 年 8 月～令和 7 年 6 月（11 カ月）
2. 公園整備工事期間の変更
当初 令和 7 年 1 月～令和 8 年 6 月（18 カ月） ➡ 変更 令和 7 年 7 月～令和 8 年 12 月（18 カ月）
但し、両方の工事とも前倒し完了に努めてまいります。
3. 施設オープン時期の変更（A・Bゾーン同時オープン予定）
当初 令和 8 年 7 月 ➡ 令和 8 年 11 月～令和 9 年 1 月（4～6 カ月遅延）
※前倒しオープンに努めます。

令和 年・月	6			7							8					9		
	8	～	12	1	～	4	5	6	7	～	12	1	～	10	11	12	1	
土砂搬出工事	■						■	■	■	■								
公園整備工事							■	■	■	■	■	■				■	■	★


★この間でオープン

また、令和 6 年 8 月より先行して行っております土砂搬出工事が完了次第、引き続き公園の整備工事に着手します。大規模な工事であり騒音、振動及び交通の面でご不便をお掛けしていますが、今後も周辺への影響を極力抑えながら工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力よろしくお願いいたします。

3. 公園整備の概要について

改めて、（仮称）南花台中央公園整備についての概要をご説明します。
今までみなさまから様々なご意見をいただき、また、河内長野市 UR 南花台団地集約跡地活用整備事業推進委員会で議論を行い、整備計画及び実施設計を進めてまいりました。

整備内容は、大きな項目として次のとおりです。

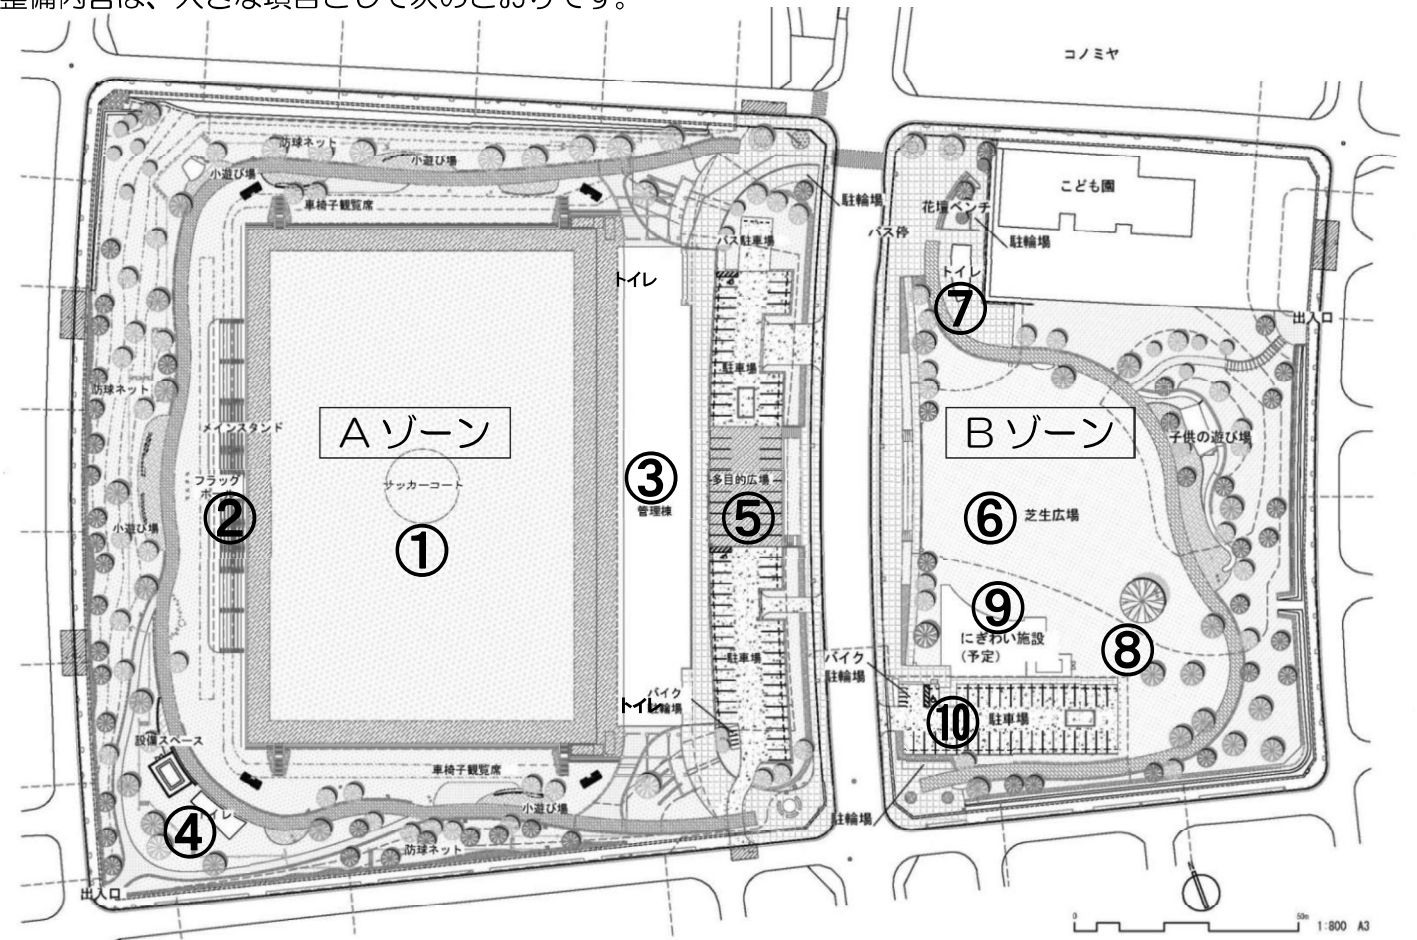

- 【Aゾーン】①サッカーコート ②観覧席（メインスタンド） ③管理棟（公衆トイレあり）
④公衆トイレ棟 ⑤駐車場
- 【Bゾーン】⑥芝生広場 ⑦公衆トイレ棟 ⑧コンビネーション遊具
⑨賑わい施設 ⑩駐車場
- 【共 通】公園園路、植栽・樹木、遊具（音、学習）、ベンチほか備品

4. 最後に

今後も長期間に及ぶ整備工事であり、特に周辺住民のみなさまにはご理解・ご協力をいただき、完成オープンを目指してまいりますので、よろしくお願いいたします。

