


■(仮称)南花台中央公園整備事業基本・実施設計業務 マスター工程表(案)

		2023年							2024年					
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
河内長野市スケジュール	市議会	3月議会	●庁議4/25	●全協	6月議会			9月議会			12月議会			3月議会
	予算・議案				●議決			●補正予算 (R5国費減額分)			●補正予算 (工事費)			●工事発注議決
	UR跡地購入	当初予算上程	譲渡額・契約内容協議		財産取得議案上程	土地売買契約	権利移転							
	都市計画 (用途地域、公園、地区計画他) ※基本計画確定に合わせて整理必要	関係機関 下協議 府 計画推進課 下協議	下協議 回答	関係機関 照会・回答 府 計画推進課 事前協議	事前協議 回答	16条第1項 公聴会及び説明会	協議の回答 府 計画推進課 協議	19条3項 協議申出	協議の回答受理 17条 公告・縦覧・意見書の受理	都市計画審議会 (付議)	★ 都市計画決定・公示			
補助金手続き (過年度事例想定)	製本提出	早着申請	第1回計画変更にかかる集中相談	概要要望			第2回計画変更にかかる集中相談			本要望	繰越調書作成	概算請求	実績報告	
設計スケジュール	基本設計・実施設計	準備期間	基本設計1 (約2ヶ月)	基本設計2 (約2.5ヶ月)			実施設計 (約7.5か月)							
	推進委員会前打合せ日程	●3/15	●4/7(金)	●5/15(月)	●6/16(金)	●7/11(火)	●8/8(火)	●9/5(火)	●10/10(火)	●11/7(金)	●12/5(火)	●1/9(火)	●2/6(火)	●3/5(火)
	推進委員会	●3/2	●4/13(木)	●5/26(金)	●6/23(金)	●7/21(金)	●8/18(金)	●10/4(水)	●10/20(金)	●11/17(金)	●12/15(金)	●1/19(金)	●2/16(金)	●3/15(金)
	南花台中央公園 スタジアム定例会議 (原則毎月第4木曜)		●3/30(木)	●4/26(水)	●6/8(木)	●6/29(木)	●7/27(木)	●8/24(木)	●9/28(木)	●10/26(木)	●11/30(木)	●12/21(木)		
	ワークショップ				●中学生WS①6/30(金)		●中学生WS② 9/1		●WS② 10/1	●WS③ 10/29	●WS④			●WS⑤
	市民説明会					●近隣説明7/29	●説明会				●説明会+イベント+フォーラム			
	追加業務工程						基本設計パース作成 模型作成		概略工事工程作成				実施設計パース作成	調査結果とりまとめ
	設計JV品質管理スケジュール	キックオフミーティング▲				▲DR1	▲計画会議 ▲整合性確認	▲DR2 ▲一般図確定会議	DR-2 基本設計内容を審査する	▲DR3	DR-3 実施設計内容を審査する			
						▲DR1 DR-1 これからのようにPRを進めていくかの審査プロセス	▲計画会議 役員によるデザインの方向性を確認	▲設計検証 ▲基本設計リリース承認		▲設計検証 ▲整合性確認				▲実施設計リリース承認

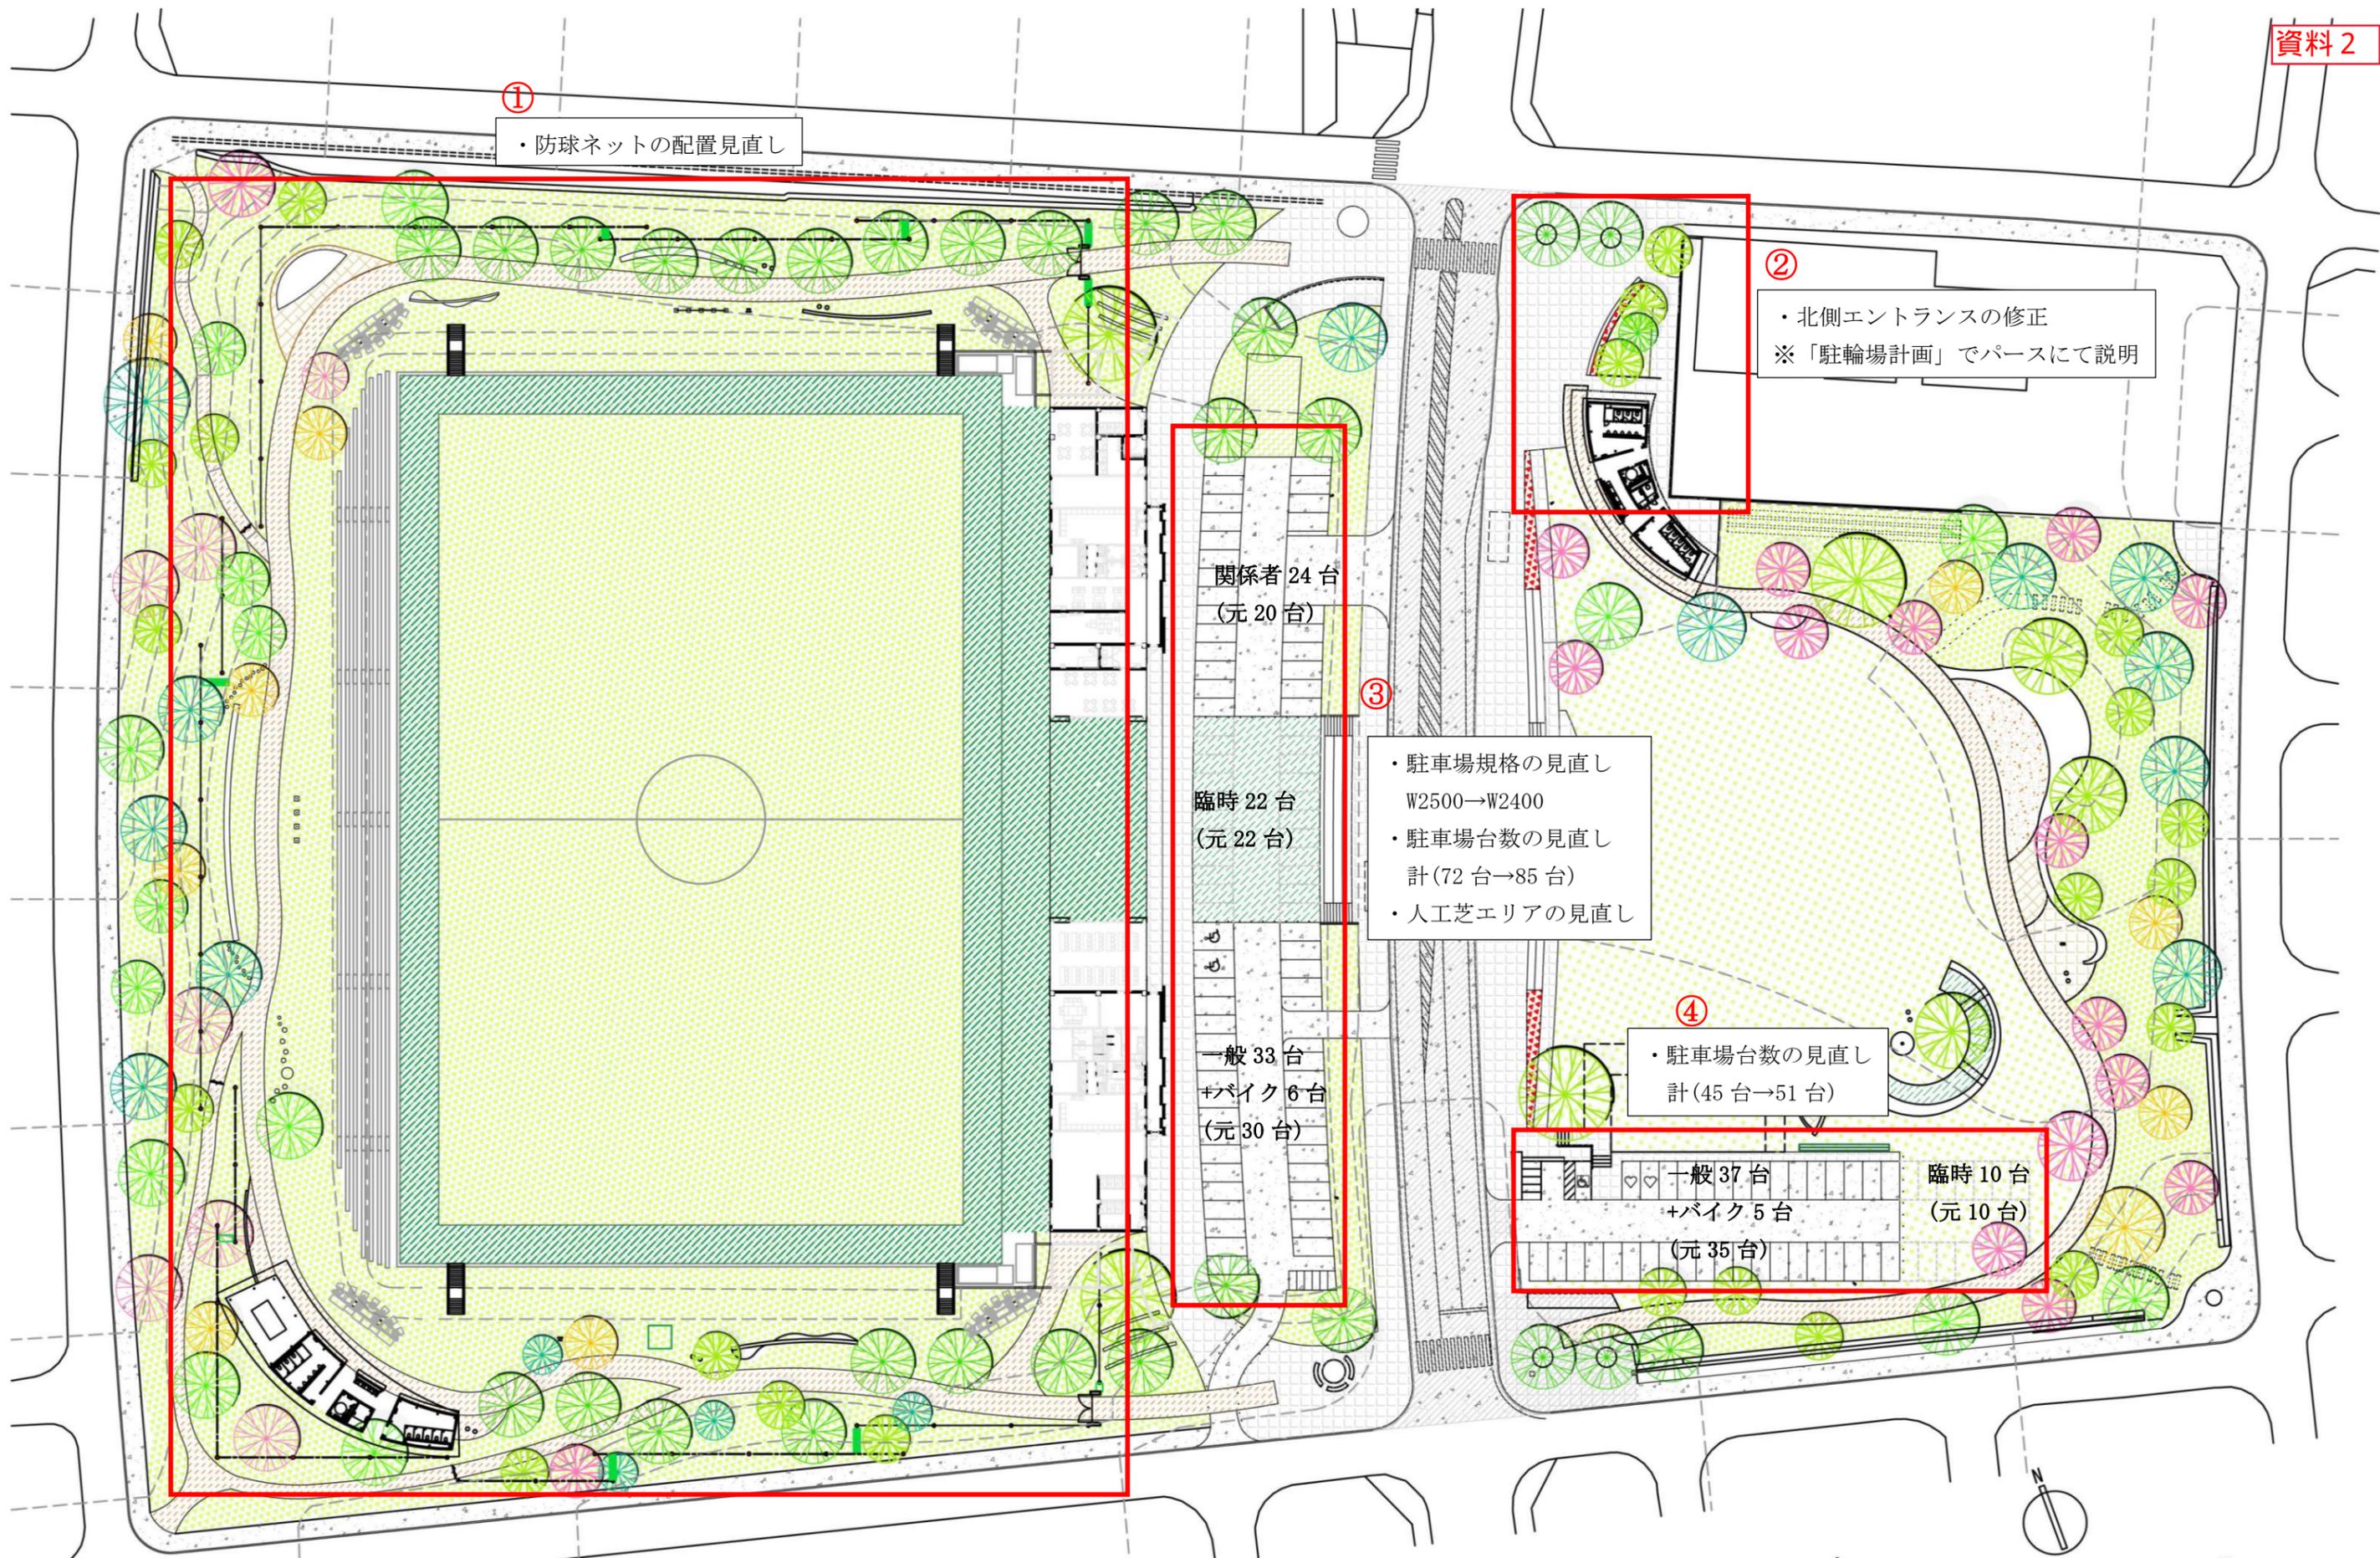

①
・防球ネットの配置見直し

②
・北側エントランスの修正
※「駐輪場計画」でパースにて説明

関係者 24 台
(元 20 台)

臨時 22 台
(元 22 台)

一般 33 台
+バイク 6 台
(元 30 台)

③
・駐車場規格の見直し
W2500→W2400
・駐車場台数の見直し
計(72 台→85 台)
・人工芝エリアの見直し

④
・駐車場台数の見直し
計(45 台→51 台)

一般 37 台
+バイク 5 台
(元 35 台)

臨時 10 台
(元 10 台)

駐輪場：計 58 台
バイク駐輪場：11 台

駐輪場：25 台
北側を H800 内外の意匠壁で、
駐輪場・駐車場への視線隠し

駐輪場：15 台
植栽帯で視線隠し

バイク駐輪場：5 台
入口近くに設置

バイク駐輪場：6 台
入口近くに設置


駐輪場：18 台
北側を H800 内外の意匠壁で、
駐輪場の明示/駐車場への視線隠し



イメージパース A



イメージパース B

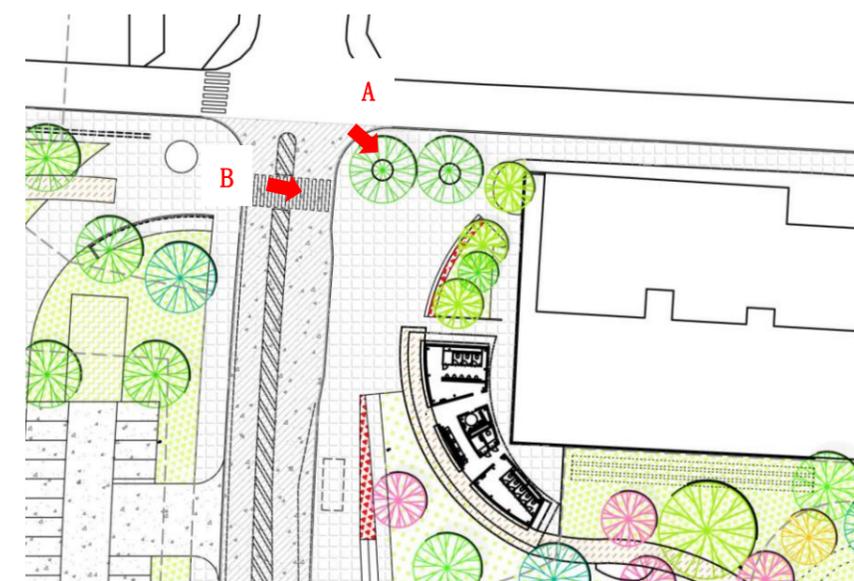

2023/09/27 に公園予定地にて、舗装のモックアップを作成。すべて、同じ色調で、「顔料のみ」「ショットブラスト仕上げ」「研磨（荒磨き）」の3色張りで馬目地張りにて実施。試験結果を踏まえ、舗装の色調を決定（最終調整中）。



黄土系
顔料品が際立ち、モザイク調が目立つ。
照り返しはやや気になる。



赤土系
顔料品が際立ち、モザイク調が目立つ。
照り返しはほとんど気にならない。



淡グレー系
全体に調和した色合いである。
照り返しはやや気になる。



白系
顔料品が目立ってモザイク調が目立つ。
照り返しが気になる。



濃グレー系（A社）
顔料品が際立ち、モザイク調が目立つ。
照り返しはほとんど気にならない。




濃グレー系（B社）
顔料品が目立ってモザイク調がやや目立つ。
照り返しはほとんど気にならない。
⇒研磨(最も白いもの)をより暗いグレーに変えて、継続検討


植栽凡例

記号	名称	規格・仕様
●	常緑高木 大	H=8.0m内外
○	常緑高木 中	H=5.0m内外
●	常緑高木 小	H=3.5m内外
○	落葉高木 大	H=8.0m内外
○	落葉高木 中	H=5.0m内外
○	落葉高木 小	H=3.5m内外
■	低木・地被類	花壇を含む
■	芝生	ノシバ
■	芝生	改良ノシバ(休眠期短縮品種)

候補樹種

常緑高木	アラカシ、シラカシ、クリ、クスノキ、ナナミノキ、ツバキ、サザンカ、ヤブニッケイ、ソヨゴ、ハイノキ、等
落葉高木	ケヤキ、エノキ、カツラ、コナラ、ヤマボウシ、サルスベリ、ヤマザクラ、イロハモミジ、アオダモ、コブシ等
低木地被	サツキ、アベリア、ヒメウツギ、クリスマスローズ、ノシラン、ヤブラン、ギボウシ、ヤブコウジ、等

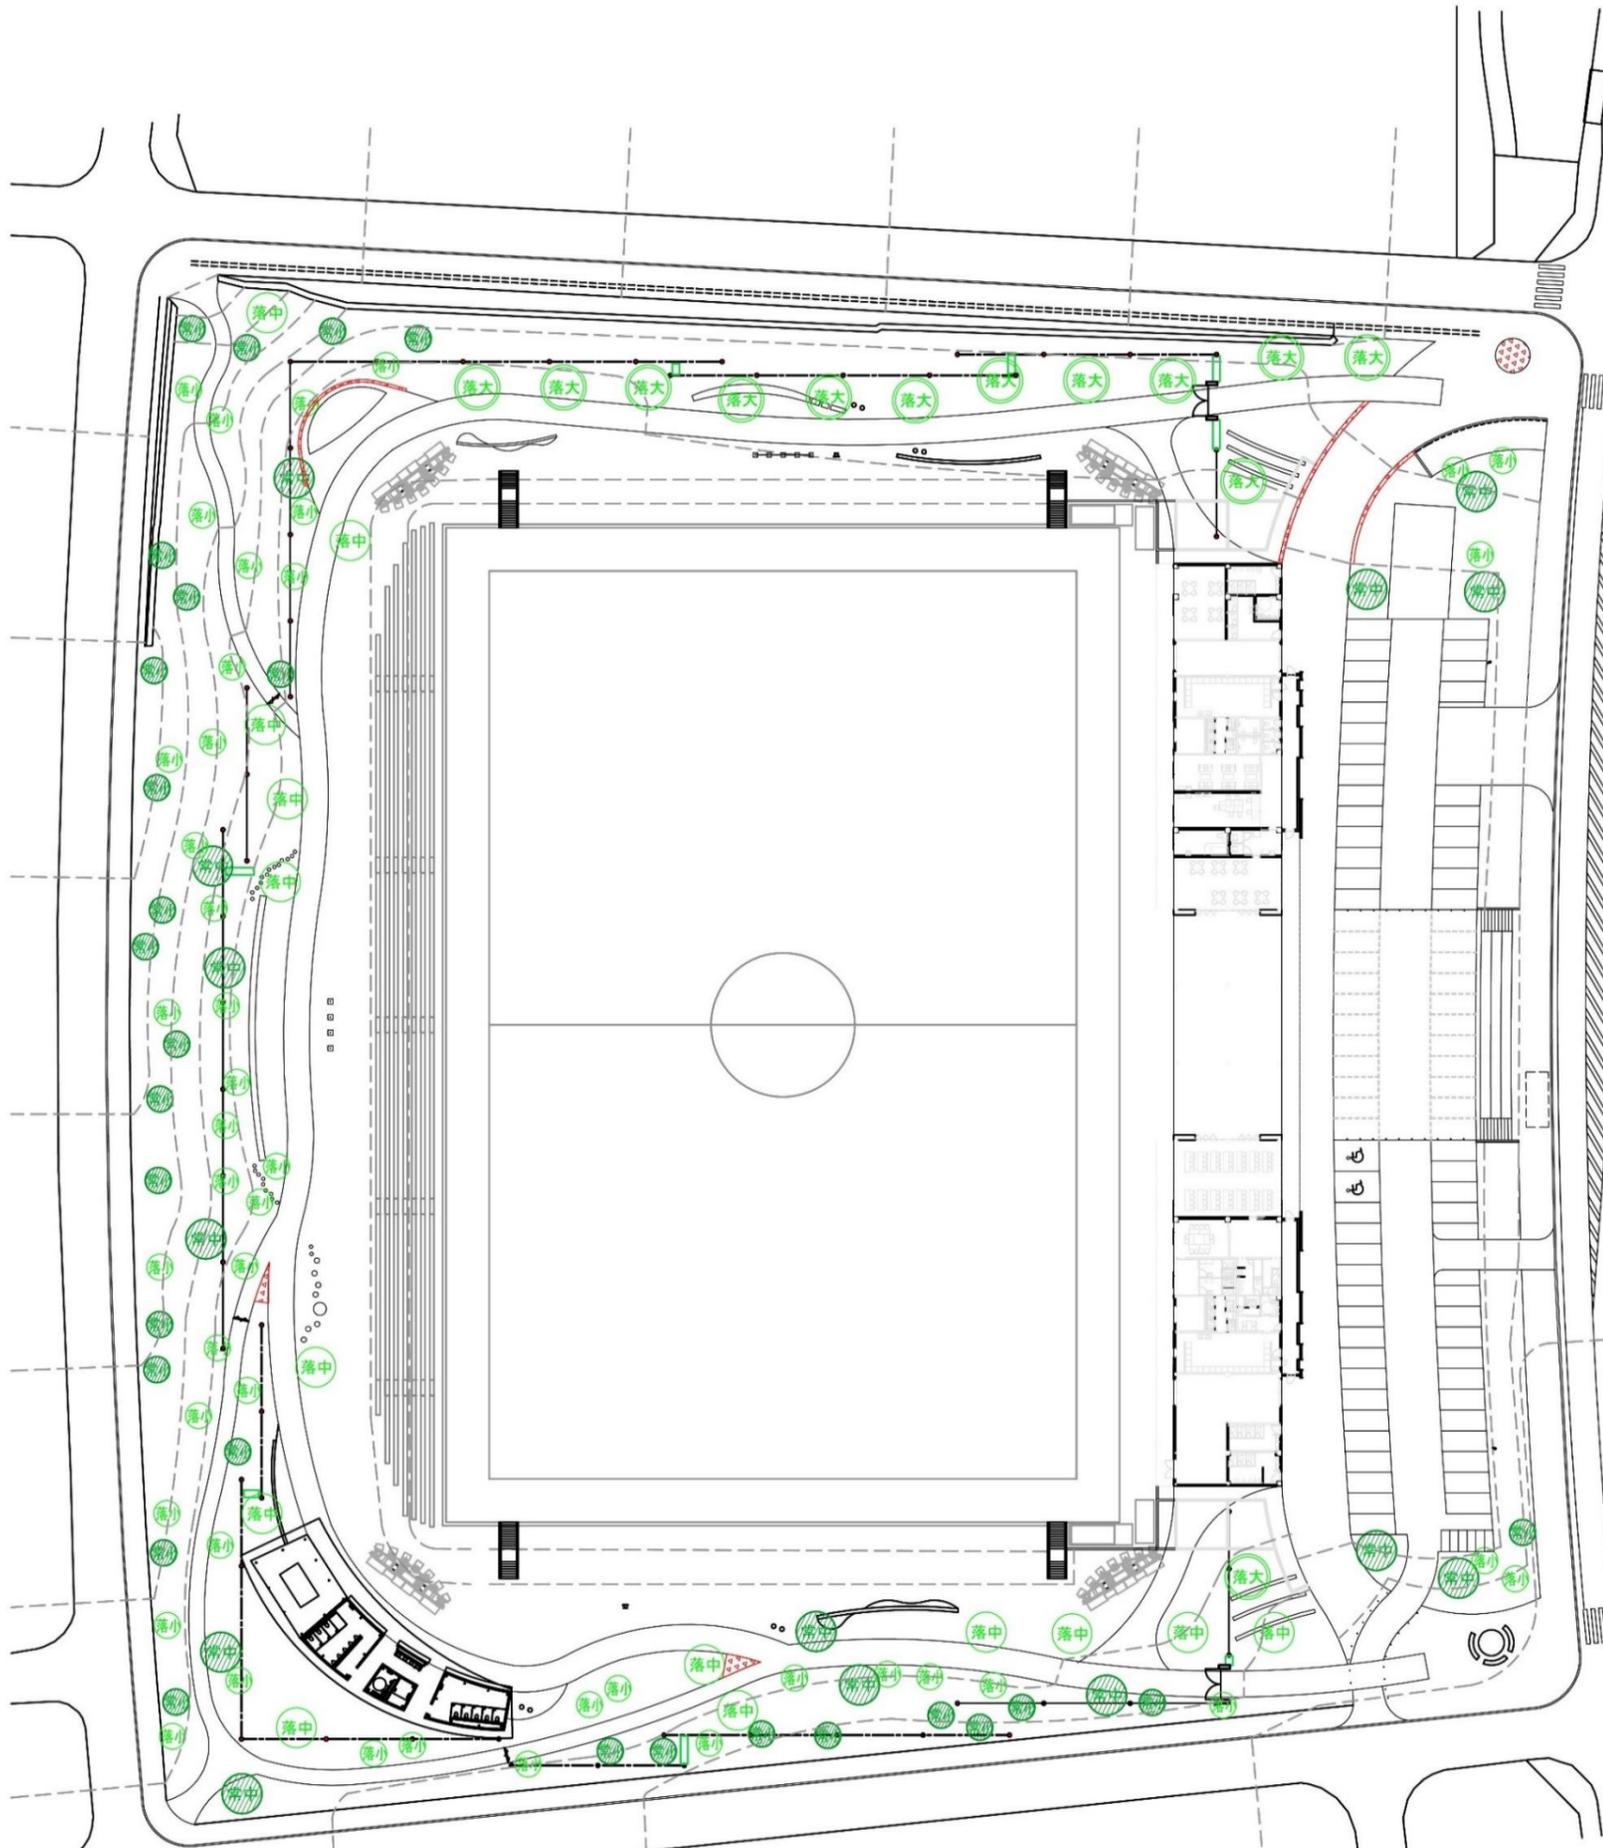

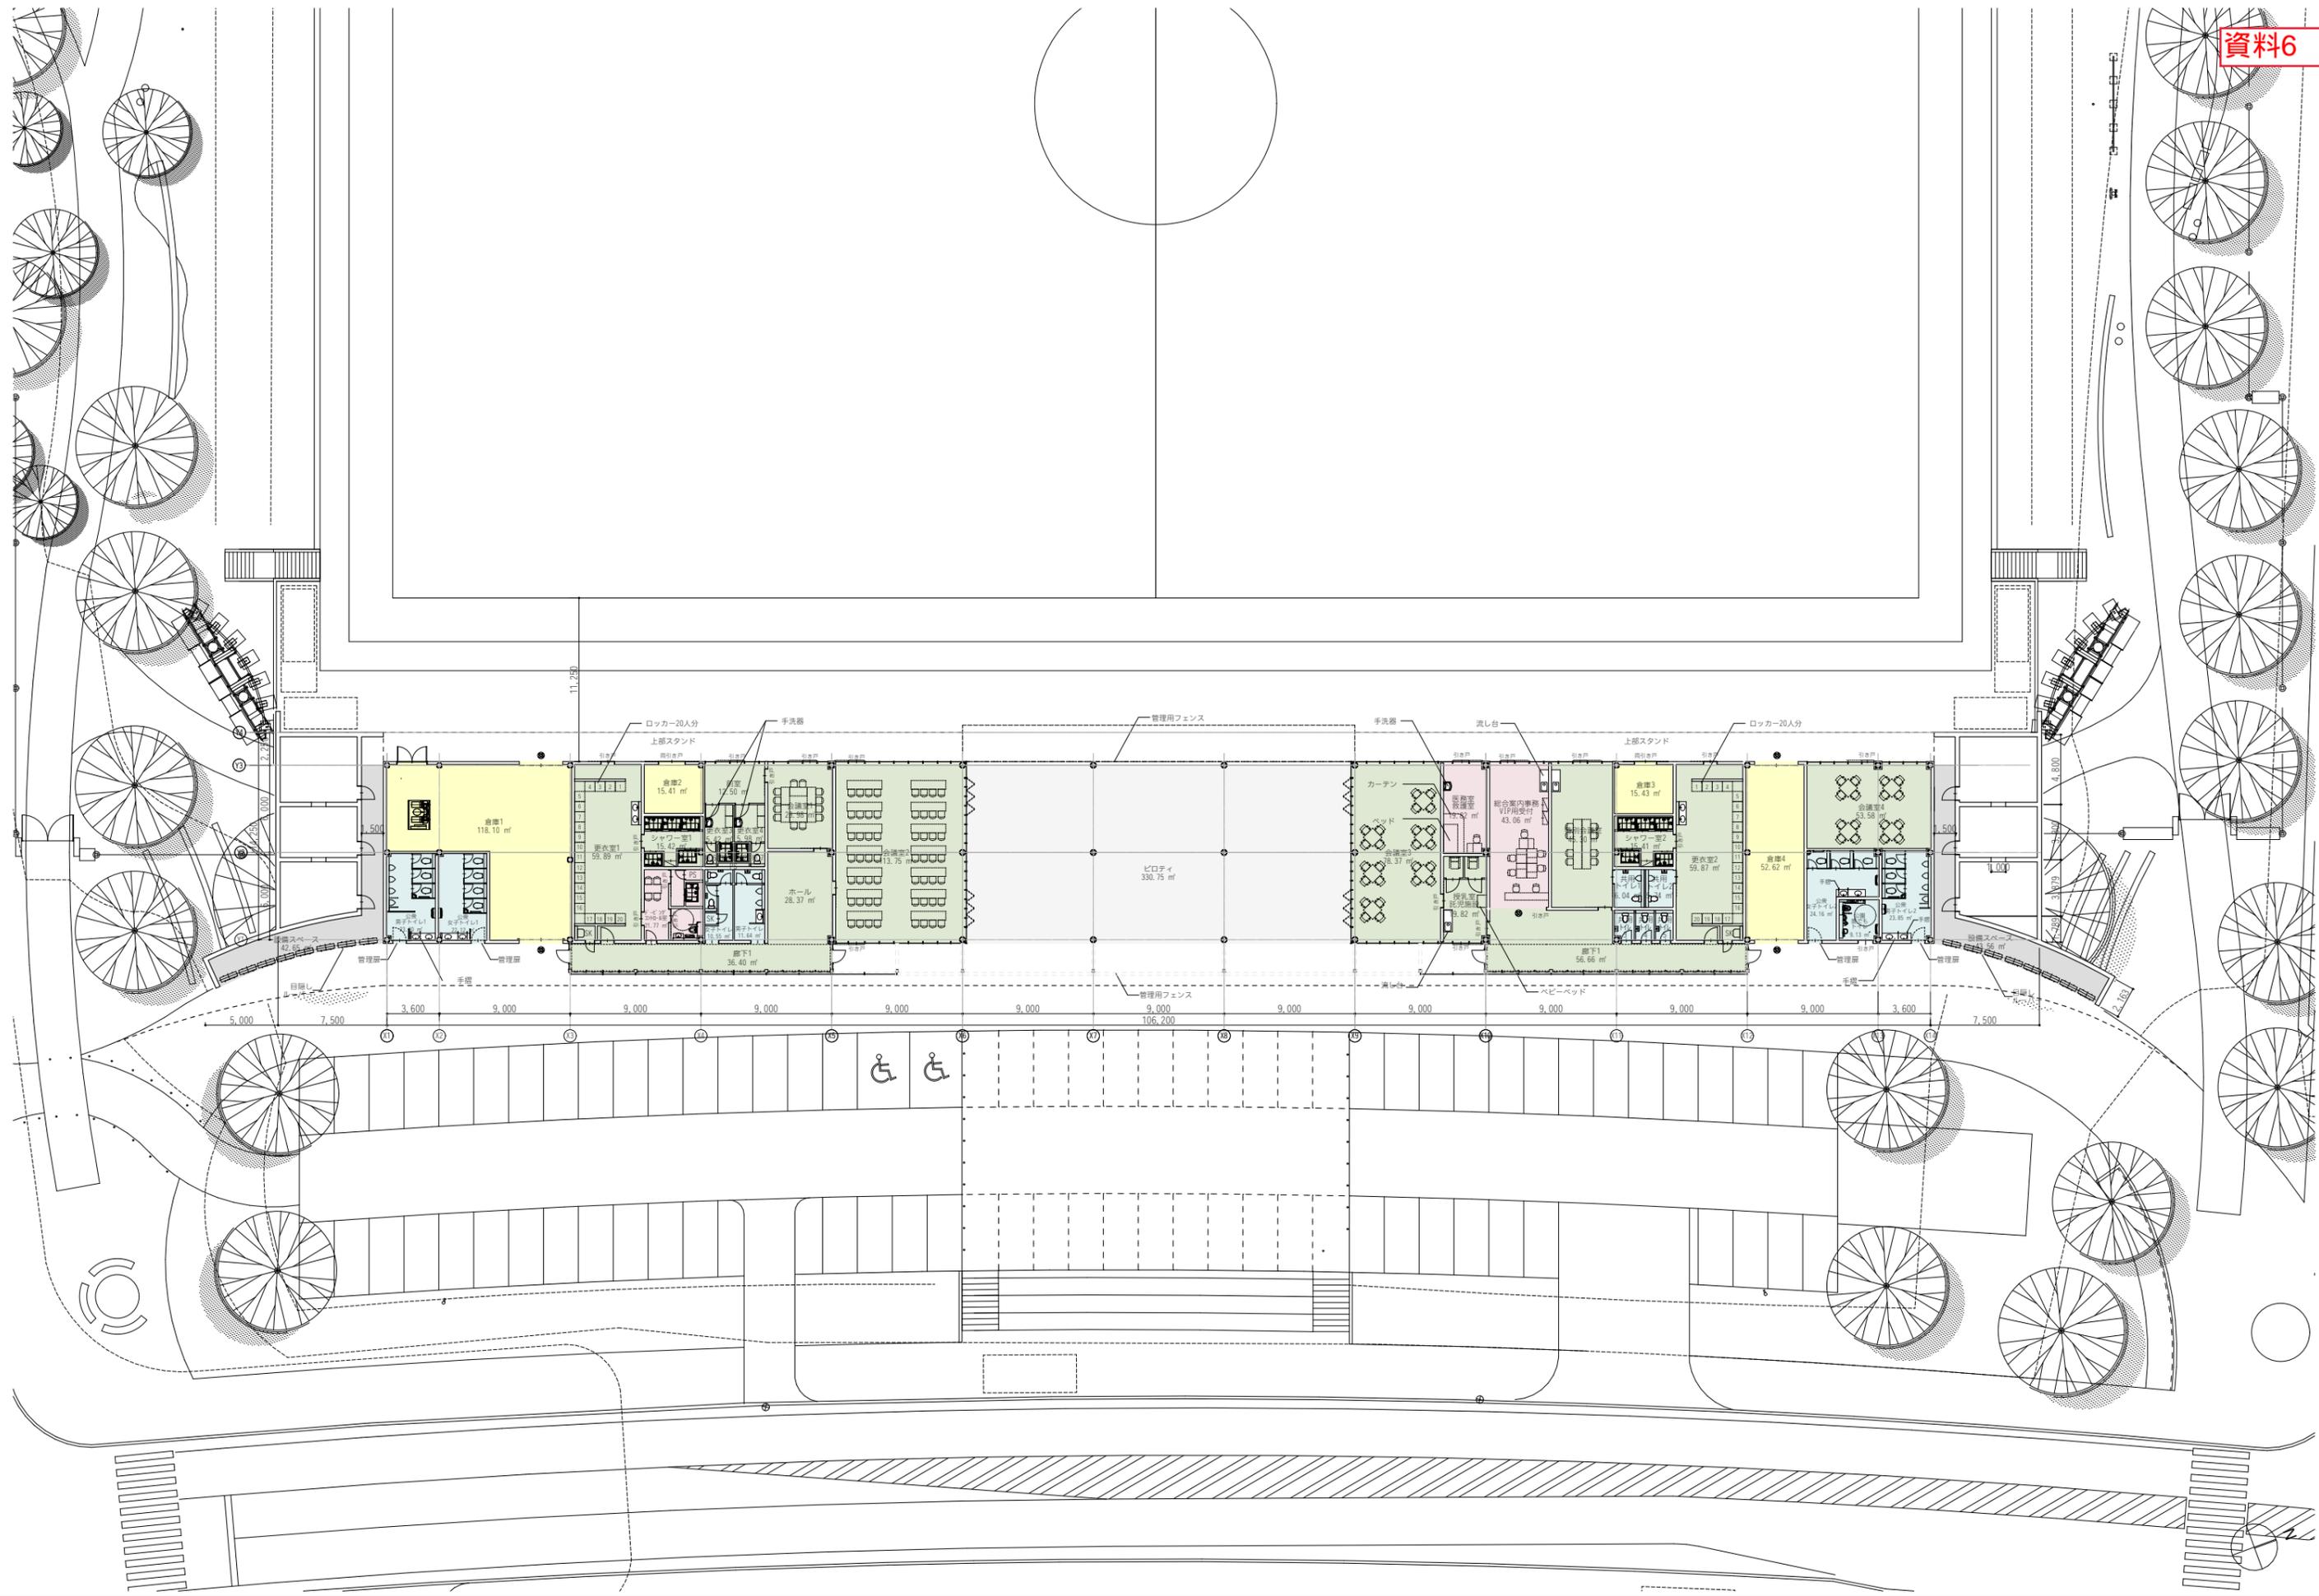

外壁色検討①：ダークグリーン案



外壁色検討②：モノトーン案（ブラック）





外壁色検討③：モノトーン案（グレー）




外壁色検討④：モノトーン案（ライト）



シャッター検討

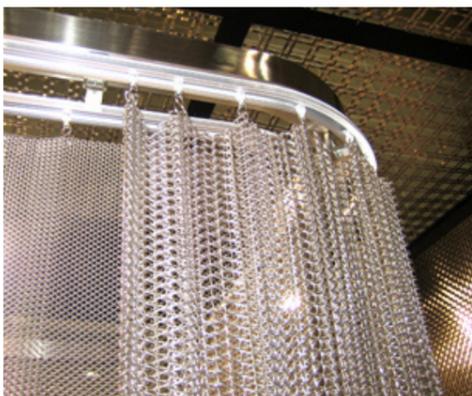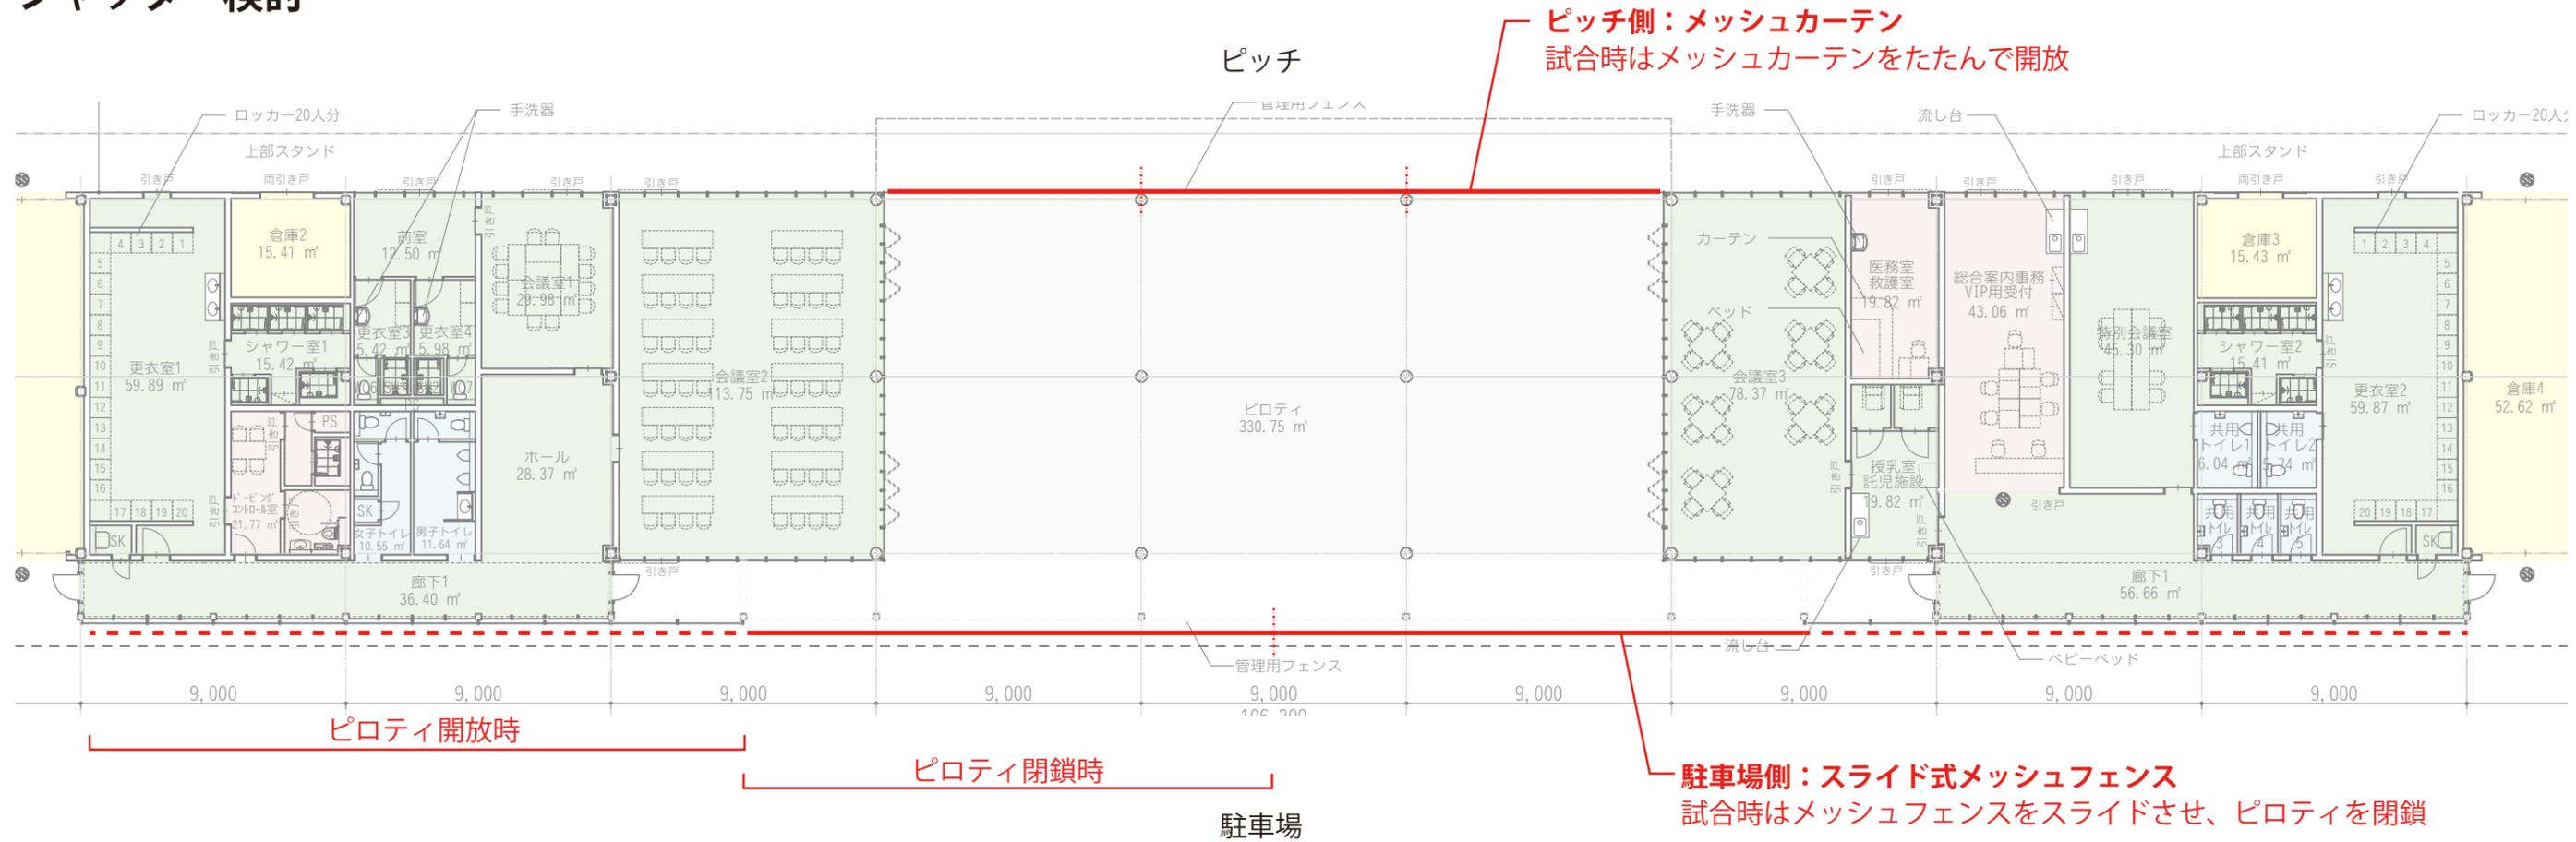


ピッチ側：メッシュカーテン参考画像

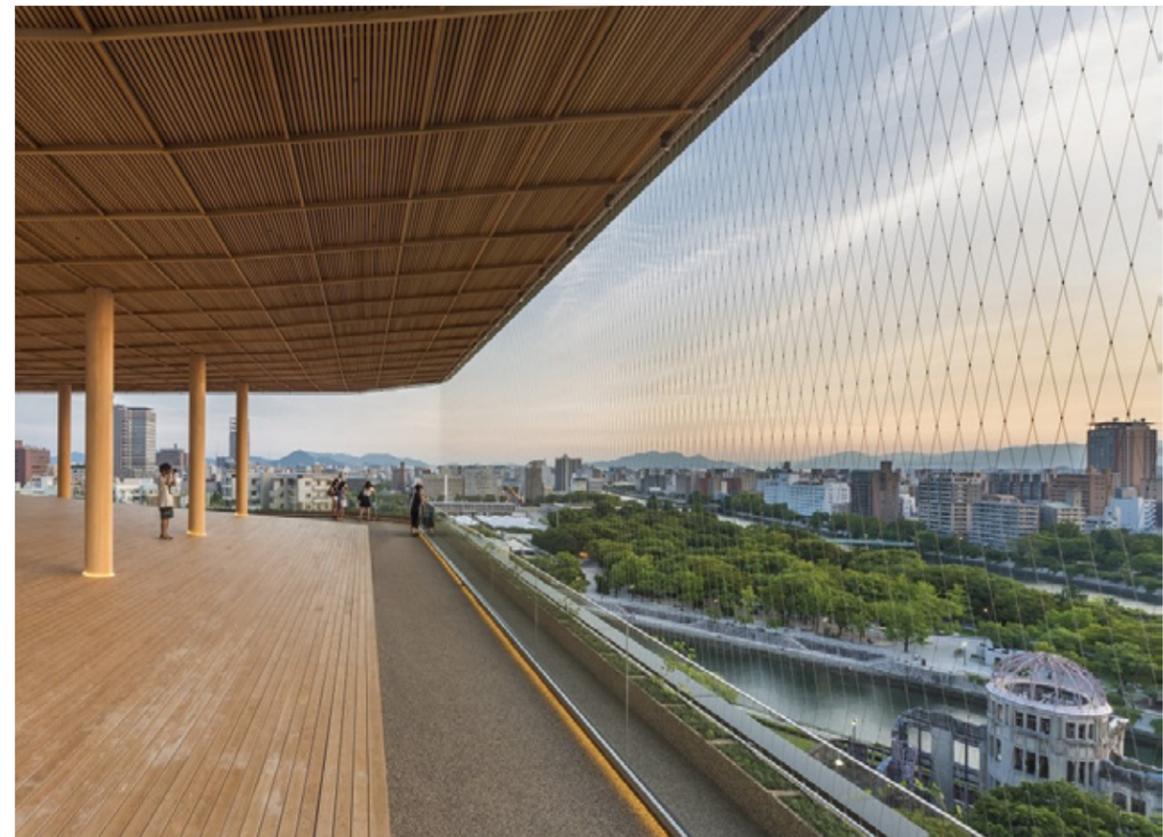


駐車場側：スライド式メッシュフェンス参考画像


駐車場側シャッター検討

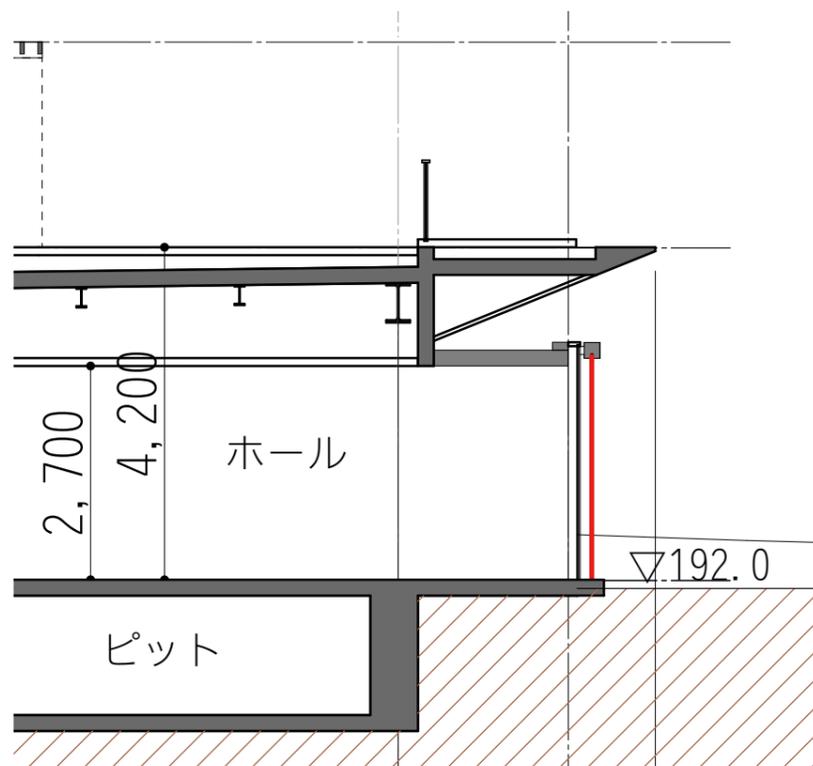

断面図

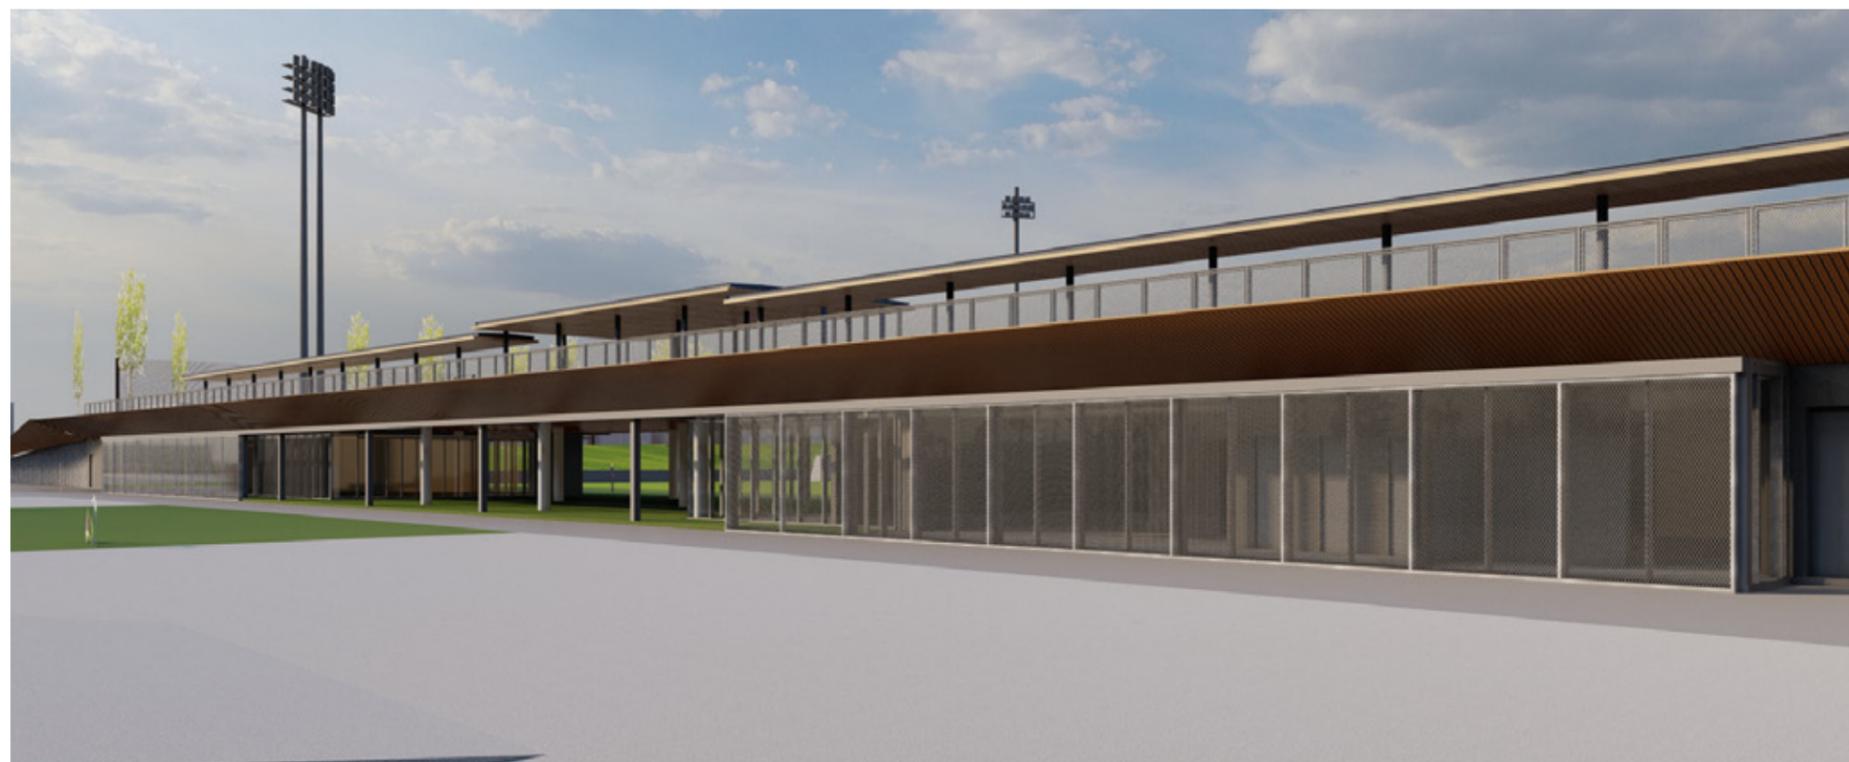

駐車場からクラブハウス棟を見る。

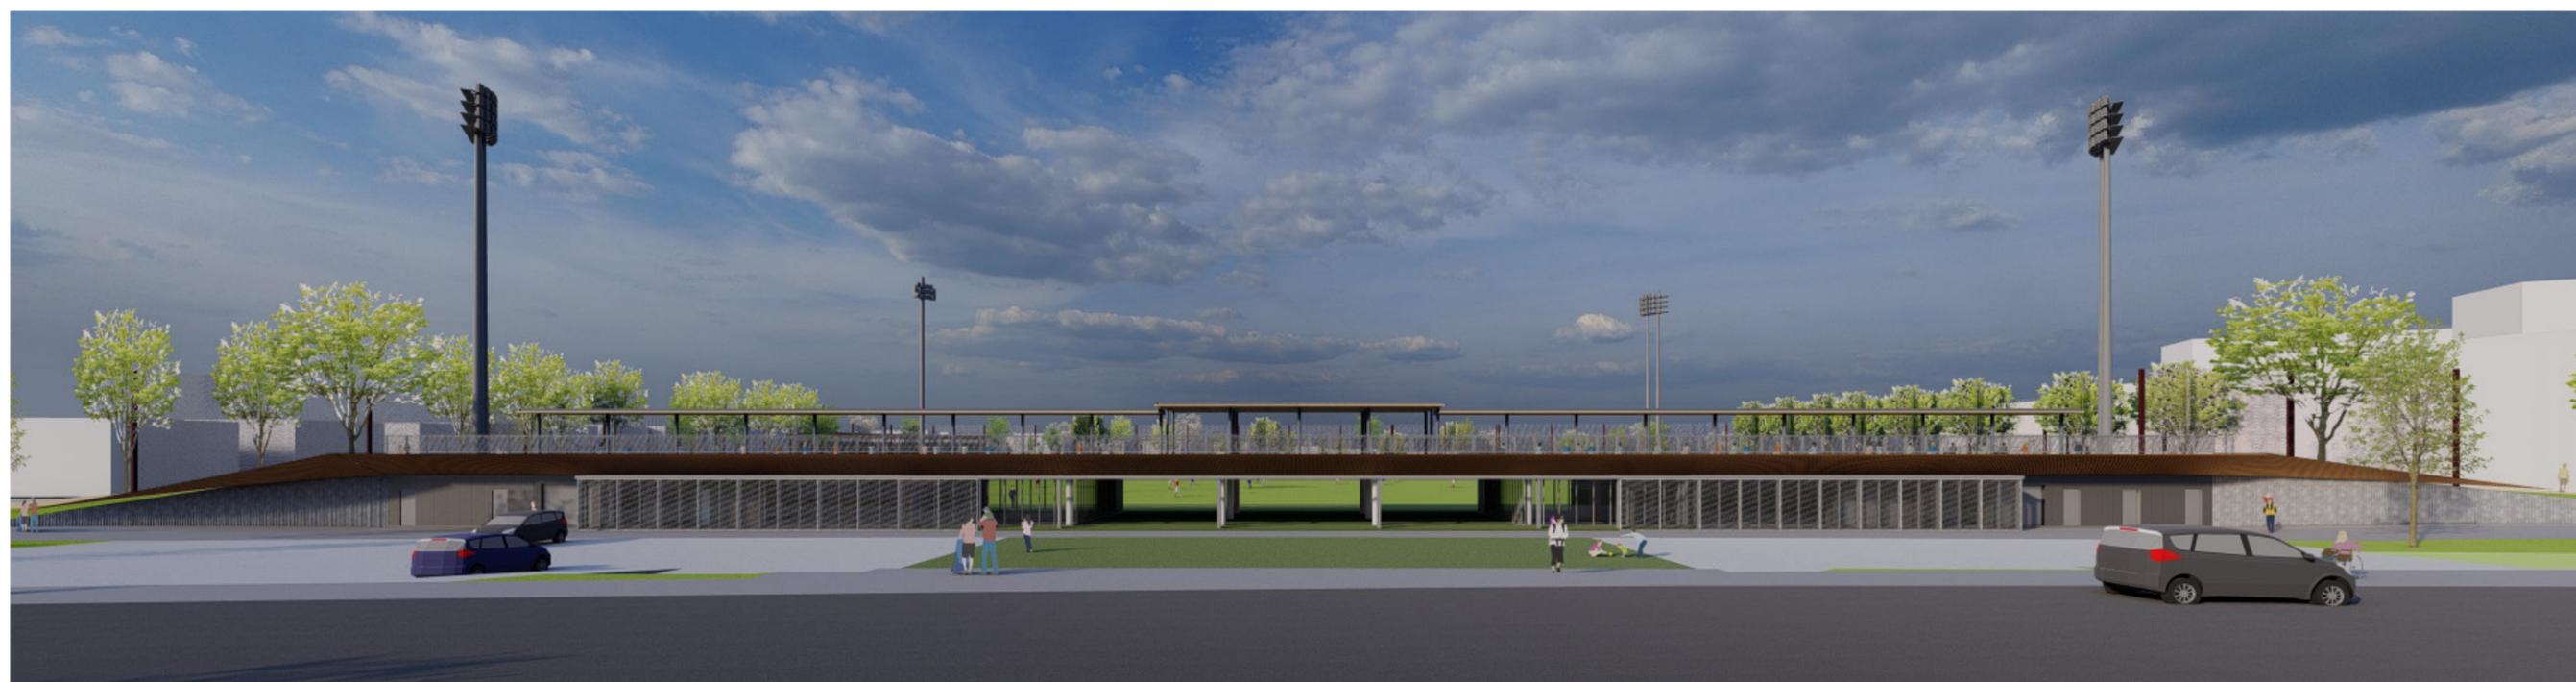

Bゾーンからクラブハウス棟を見る。
