


現場全体写真
(9.4時点)



工事進捗状況② 令和6年8月

8月より既存構造物の本格的な解体工事を実施しています。重機は低騒音型を使用し、騒音・振動の抑制に努めています。また、解体に伴う粉じん対策として、散水を行い粉じんの飛散防止を行うとともに、構造物をシートで囲んで作業しています。

野外ステージ屋根
解体の様子

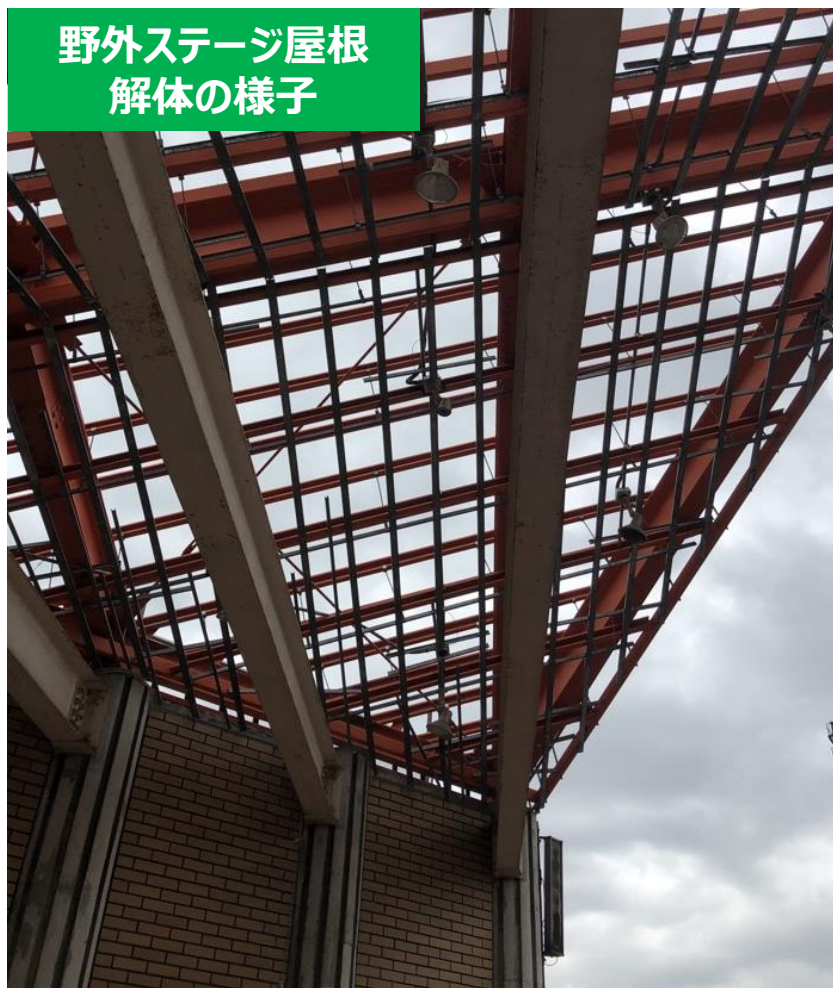

観覧スタンド
解体の様子



工事進捗状況③ 令和6年8月

工事用車両専用の出入口を設置し、重機の搬入や解体に伴う廃棄物の搬出を行っています。
車両のタイヤに付着した泥等で道路が汚れないよう、搬出の際には車両のタイヤ洗浄を実施しています。

工事用車両
出入口の様子

