
令和 8 年 10 月 24 日

1. 南花台中央公園（愛称：SAKAS 南花台）のオープン時期について

令和7年7月より公園本体工事に着手し、令和8年12月末完成を目指して順調に工事を進めてきましたが、昨今の中東情勢により一部部材の入手見通しが立たない一定期間が発生しました。材料変更など工事受注者とは情勢を踏まえ連携した対策を行ってきましたが、影響が想定以上に大きく、品質を確保したうえで現在の工期内完成は難しいと判断しましたので、この度オープンを令和8年12月末から令和9年2月26日に変更します。

2. 工事現場の工事車両出入口の変更について

これまでは公園敷地内を中心に工事を行ってきましたが、これから完成に向けて公園敷地の周囲や道路（歩道）部分も改修等行います。南花台1号線沿いの白い仮囲いも順次撤去し、工事車両の出入口も変更となります。

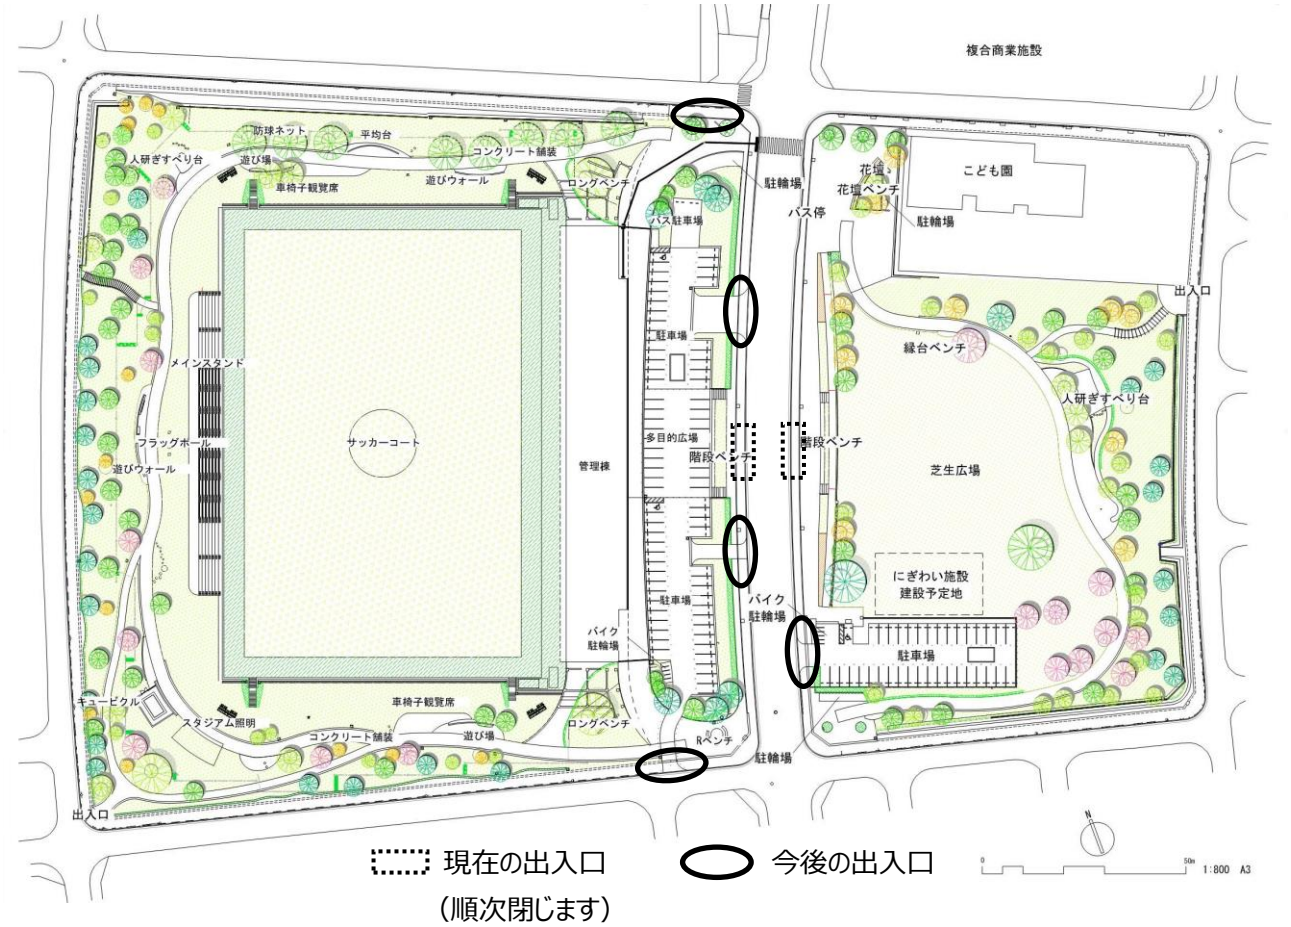

3. 公園・スタジアムオープン前後のイベントについて（予定）※第1弾　現場見学会　R8.8.29開催済

①工事期間　第2弾　現場見学会　：令和9年1月頃
②工事期間　第3弾　オープニングセレモニー（完成式典）　：令和9年2月26日（予定）
③オープニングイベント（スペランツァ大阪　公式試合初戦応援含む）　：令和9年3月中旬

河内長野市　成長戦略局　まち創造戦略部
まちデザイン課

(仮称)南花台中央公園整備工事　工事のお知らせ

村本建設株式会社
(仮称)南花台中央公園整備工事作業所
連絡先：村本建設株式会社　大阪支店
TEL：06-6772-8024　　FAX：06-6772-8062


平素より(仮称)南花台中央公園整備工事施工にご協力いただき、誠に有難うございます。
現在の工事進捗状況は、2026年に発生した中東情勢により資材の納入が大幅に遅れる事態が発生した影響により、約2ヶ月の遅れが発生している状況であります。
工事期間が延長することによって、ご近隣の皆様にもご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。

今後の工事といたしましては、市道近接部分の工事が主要工事となってまいります。（下図(左)参照）
南花台1号線(バス通り)では、歩道改修及び出入り口部分の改修工事を行い、その他の市道（歩道）部分におきましては、ＵＲ住宅時の進入路部分の改修工事を行います。
特に、南花台1号線（バス通り）の改修工事は、現状歩道のｱﾌｧﾙﾄ舗装からｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装になる為、街路樹の伐採からｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装への改修が完了するまで片側約2・3週間程度の期間を終日歩道通行止めをさせて頂き施工を行う予定です。
＊歩道通行止め時はバス停の位置を少し移動する場合がありますが、バス停へのルートの確保を行い対応させて頂きます。

工事車両通行ルートにおきましては、工事開始より通行していたルート（北側方向からの進入・北側方向への退出）での搬入出が不可能になる為、下図(右)のルートによる通行を行います。

また、スタジアム照明設備におきましても照明角度の微調整を行う必要がありますので、12月に実施させて頂きます。(最長21：00まで・数日間実施)

工事開始時よりご不便をおかけしておりますが、ご協力お願いいたします。

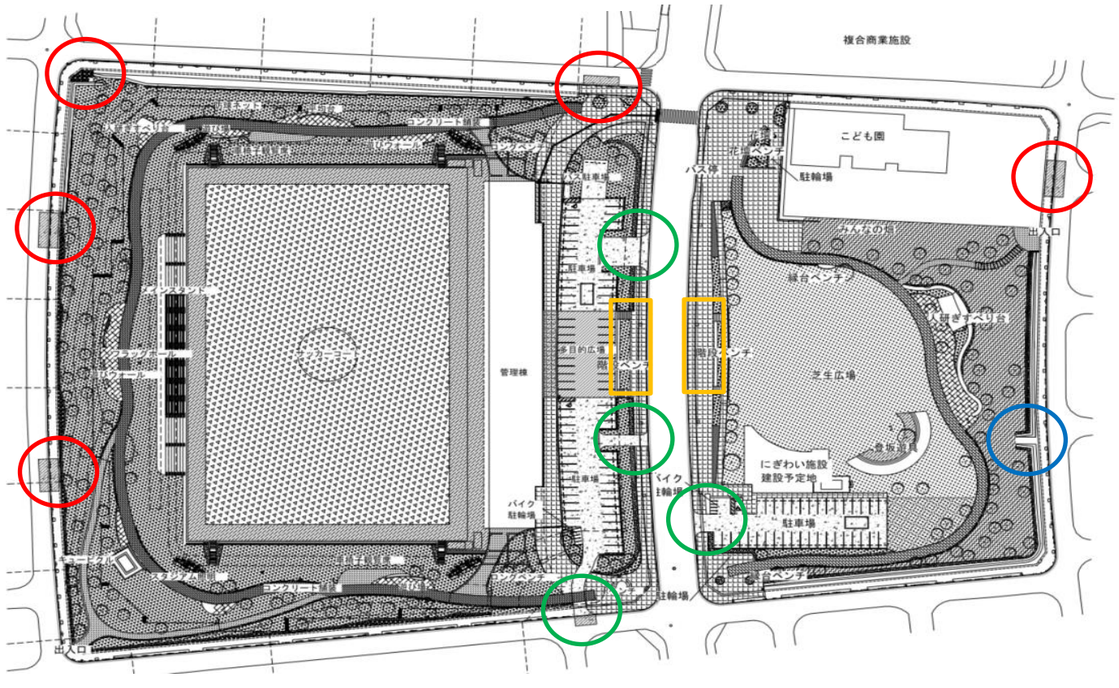

○　ＵＲ住宅時代の車両出入口改修部分
○　既存階段の改修工事部分
○　新設出入口
□　現状の工事車両出入口

